



# ¿Cómo se definen actividades e hitos?


Gestionando el tiempo y costo del proyecto

# ¿Cuál es el punto de partida?



- La EDT de un proyecto por definición no incluyen actividades, el nivel inferior de la EDT son los paquetes de trabajo.
- A partir de los paquetes de trabajo se deben descomponer las actividades.
- Recuerden los paquetes de trabajo son productos, mientras que las actividades son acciones.

# Veamos un ejemplo

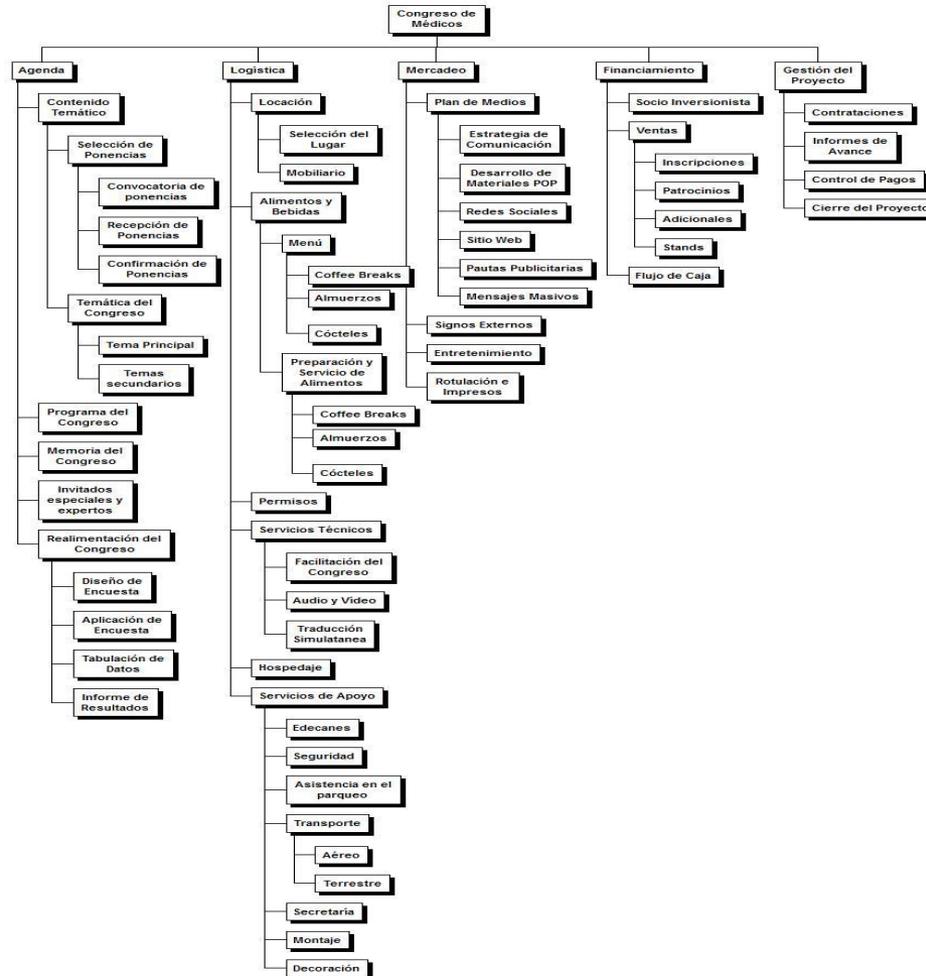


# Definir actividades



- El nivel inferior de cada ramificación representa los paquetes de trabajo.
- Los paquetes de trabajo deben ser descompuestos en actividades.



# Paquetes de Trabajo de Logística

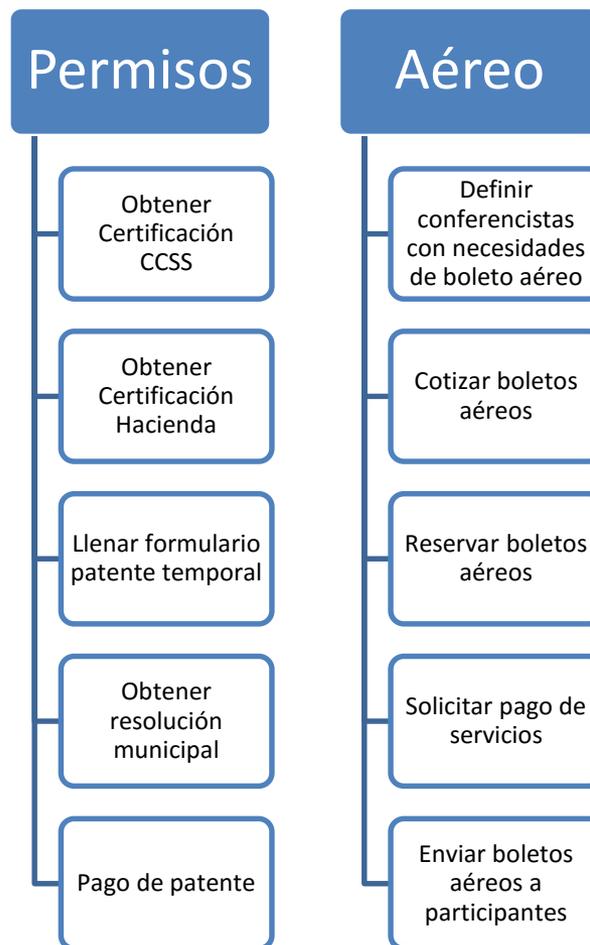


Cada paquete de trabajo es descompuesto en las acciones requeridas para lograr el objetivo que persigue cada entregable.

# ¿Qué es un hito?



- Un resultado intermedio del proyecto que de no conseguirse compromete el logro de los objetivos del proyecto.
- Es un evento, un momento. NO es una actividad.

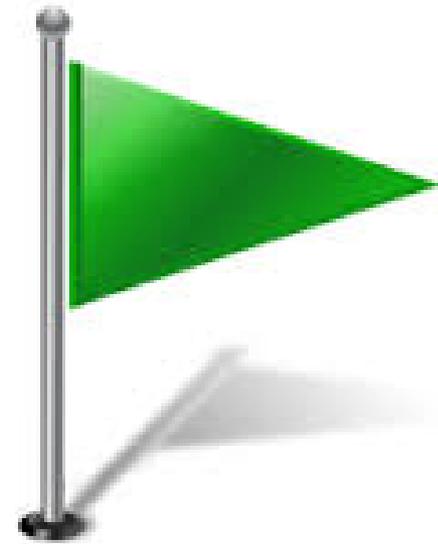

# Identificación de Hitos Congreso Médico



ID	Hito	Mes	Medio de verificación
1	Temática del congreso definida	3	Ejes temáticos definidos por Junta Directiva del Colegio de Médicos – Acta de la sesión
2	Local del congreso definido	6	Contrato de arrendamiento firmado
3	Permisos de funcionamiento obtenidos	9	Permiso expedido por la municipalidad para la realización de la actividad
4	Realimentación del congreso	12	Informe de encuestas de satisfacción presentado a la Junta Directiva y al Comité Organizador
